Maison Brioche Dorée Industrie
Usine de Rennes — Hall Tranchage L2
Contact : Marc Lefèvre (Responsable Travaux Neufs)

Rapport quotidien de chantier

Jour 2 / 4 — 03/11/2026

Installation ligne de tranchage & convoyage BFR (AFF-2026-114)

VOTRE INTERLOCUTEUR CHANTIER BFR SYSTEMS :
Julien Martin — Chef de chantier BFR Systems · Tél. 06 98 76 54 32 · j.martin@bfrsystems.com
Équipe présente sur site : 2 techniciens BFR | Horaires : 07h30 – 17h30

1. SYNTHÈSE & AVANCEMENT DU CHANTIER

Jour 2 · 03/11/2026

Chantier / Projet	Installation ligne de tranchage & convoyage BFR
Équipement / Ligne	Ligne BFR Tranchage + Convoyeur modulaire
N° d'affaire	AFF-2026-114
Dates prévisionnelles	02/11/2026 au 05/11/2026
Lieu d'intervention	Usine de Rennes — Hall Tranchage L2

AVANCEMENT GLOBAL (PONDERE) — **5 / 9 tâches terminées — 65 %**

Délai écoulé : Jour 2 / 4 (50 % du planning) — **EN AVANCE SUR PLANNING · 1 ATTENTE CLIENT**

+2	5/9	2	1
Fait ce jour (03/11)	Avancement : 65 %	En cours	Bloqués (dont 1 Client)

Phase / Lot du chantier	Progression	État
1. Réception & Implantation	100 %	3/3 fait
2. Montage mécanique	88 %	2/3 fait (+2 auj.)
3. Câblage électrique & Pneumatique	25 %	0/2 fait · 1 bloq.
4. Automatisme & Mise en service	0 %	0/1 fait

Compte rendu de la journée

Châssis convoyeur aligné au laser et chevillé. Jonction mécanique trancheur terminée. Levée du blocage d'accès zone entrée ce matin.

2. POINTS BLOQUANTS, ATTENTES & LEVÉES

1 actif · 1 levé ce jour

Aléas / Points d'attention signalés ce jour

Merci de confirmer le créneau de raccordement 400V demain matin avant 10h00.

3. Câblage électrique & Pneumatique — **BLOQUE — ATTENTE CLIENT**

Raccordement alimentation générale 400V + Terre en tête d'armoire (x2)

Point bloquant : Attente tirage du câble 400V 32A par l'électricien site client jusqu'au sectionneur général BFR.
Depuis le 03/11/2026 (J2) · Attente / impact : 0,5 j

2. Montage mécanique · Attente Client — **POINT BLOQUANT LEVE CE JOUR**

Mise en place, alignement laser et nivellement châssis convoyeur

Bloqué le 02/11 -> Levé le 03/11 · Attente / impact : 2h30 · Motif initial : Zone d'entrée encombrée par palettes emballage · Résolution : Zone dégagée par le cariste client à 09h30

3. TRAVAUX RÉALISÉS CE JOUR (03/11/2026) — 2 tâches


2. Montage mécanique — **FAIT**

Mise en place, alignement laser et nivellement châssis convoyeur (x3)


Planéité réglée au laser (±0,3 mm). Chevillage chimique terminé.

COMPARATIF AVANT / APRES — PHOTO 1

AVANT



APRES

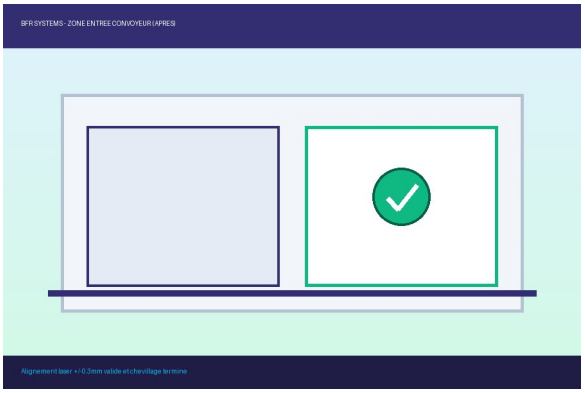

Alignement laser (±0,3 mm) et chevillage au sol châssis convoyeur

2. Montage mécanique — **FAIT**

Assemblage mécanique jonction trancheur / convoyeur d'entrée (x3)

4. EN COURS & PROGRAMME PRÉVU POUR LA SUITE — 2 en cours

2. Montage mécanique — **EN COURS (50 %)**

Pose des carters inox et protecteurs de sécurité (x2)

Côté opérateur posé ; côté moteur demain matin.

3. Câblage électrique & Pneumatique — **EN COURS (50 %)**

Passage des câbles moteurs/capteurs et alimentation air 6 bars (x2)

Programme prévu demain / Prochaines étapes

Finalisation carters sécurité, raccordement 400V dès mise à disposition client et début tests E/S.

5. ÉTAT RÉCAPITULATIF DE LA CHECKLIST CHANTIER

5 / 9 (65 %)

Tâche / Opération	Domaine	Statut	Réalisé le
1. Réception & Implantation			**3/3 (100 %)**
Accueil sécurité, PDP et balisage de la zone	—	**FAIT**	02/11
Déchargement et contrôle des sous-ensembles BFR (x2)	—	**FAIT**	02/11
Traçage au sol de l'axe de ligne avec le client (x2)	—	**FAIT**	02/11
2. Montage mécanique			**2/3 (88 %)**
Mise en place, alignement laser et nivellement châssis convoyeur (x3)	—	**FAIT**	**Ce jour**
Assemblage mécanique jonction trancheur / convoyeur d'entrée (x3)	—	**FAIT**	**Ce jour**
Pose des carters inox et protecteurs de sécurité (x2)	—	**EN COURS**	50 %
3. Câblage électrique & Pneumatique			**0/2 (25 %)**
Raccordement alimentation générale 400V + Terre en tête d'armoire (x2)	—	**BLOQUÉ**	—
Passage des câbles moteurs/capteurs et alimentation air 6 bars (x2)	—	**EN COURS**	50 %
4. Automatisme & Mise en service			**0/1 (0 %)**
Tests E/S automate, chaîne des arrêts d'urgence et essais cadences (x3)	—	**À FAIRE**	—
